Bauzeitenplan

Gensingen, Ortskernsanierung

Projektnummer:

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Baustelleneirichtung	5at	07.11.2022	11.11.2022
2	Kanalbau Kreuzstraße	20at	14.11.2022	09.12.2022
3	Kanal - HA Kreuzstraße	5at	12.12.2022	16.12.2022
4	Wasserleitungsbau Kreuzstraße	5at	19.12.2022	23.12.2022
5	Betriebsferien	15at	27.12.2022	16.01.2023
6	Wasserleitungsbau Kreuzstraße	10at	17.01.2023	30.01.2023
7	Straßenbau Kreuzstraße	52at	31.01.2023	14.04.2023
8	Kanalbau Langgasse	71at	06.02.2023	19.05.2023
9	Kanal - HA Langgasse	28at	22.05.2023	30.06.2023
10	WL - Bau Langgasse	25at	03.07.2023	04.08.2023
11	WL - HA Langgasse	20at	07.08.2023	01.09.2023
12	Straßenbau Langgasse	60at	04.09.2023	28.11.2023
13	WL - Bau westl. Kaiserstraße	18at	29.11.2023	22.12.2023
14	Betriebsferien	13at	27.12.2023	15.01.2024
15	WL - Bau westl. Kaiserstraße	14at	16.01.2024	02.02.2024
16	WL - HA westl. Kaiserstraße	20at	05.02.2024	01.03.2024
17	Straßenbau westl. Kaiserstraße	74at	04.03.2024	21.06.2024
18	Kanalbau östl. Kaiserstraße	60at	04.03.2024	03.06.2024
19	Kanal - HA östl. Kaiserstraße	29at	04.06.2024	12.07.2024
20	WL - Bau östl. Kaiserstraße	30at	15.07.2024	23.08.2024
21	WL - HA östl. Kaiserstraße	20at	26.08.2024	20.09.2024
22	Straßenbau östl. Kaiserstraße	58at	23.09.2024	13.12.2024
23	WL - Bau Zu den Bächen	15at	23.08.2024	12.09.2024
24	WL - HA Zu den Bächen	10at	13.09.2024	26.09.2024
25	Straßenbau Zu den Bächen	54at	27.09.2024	13.12.2024
26	Baustelle räumen	5at	16.12.2024	20.12.2024

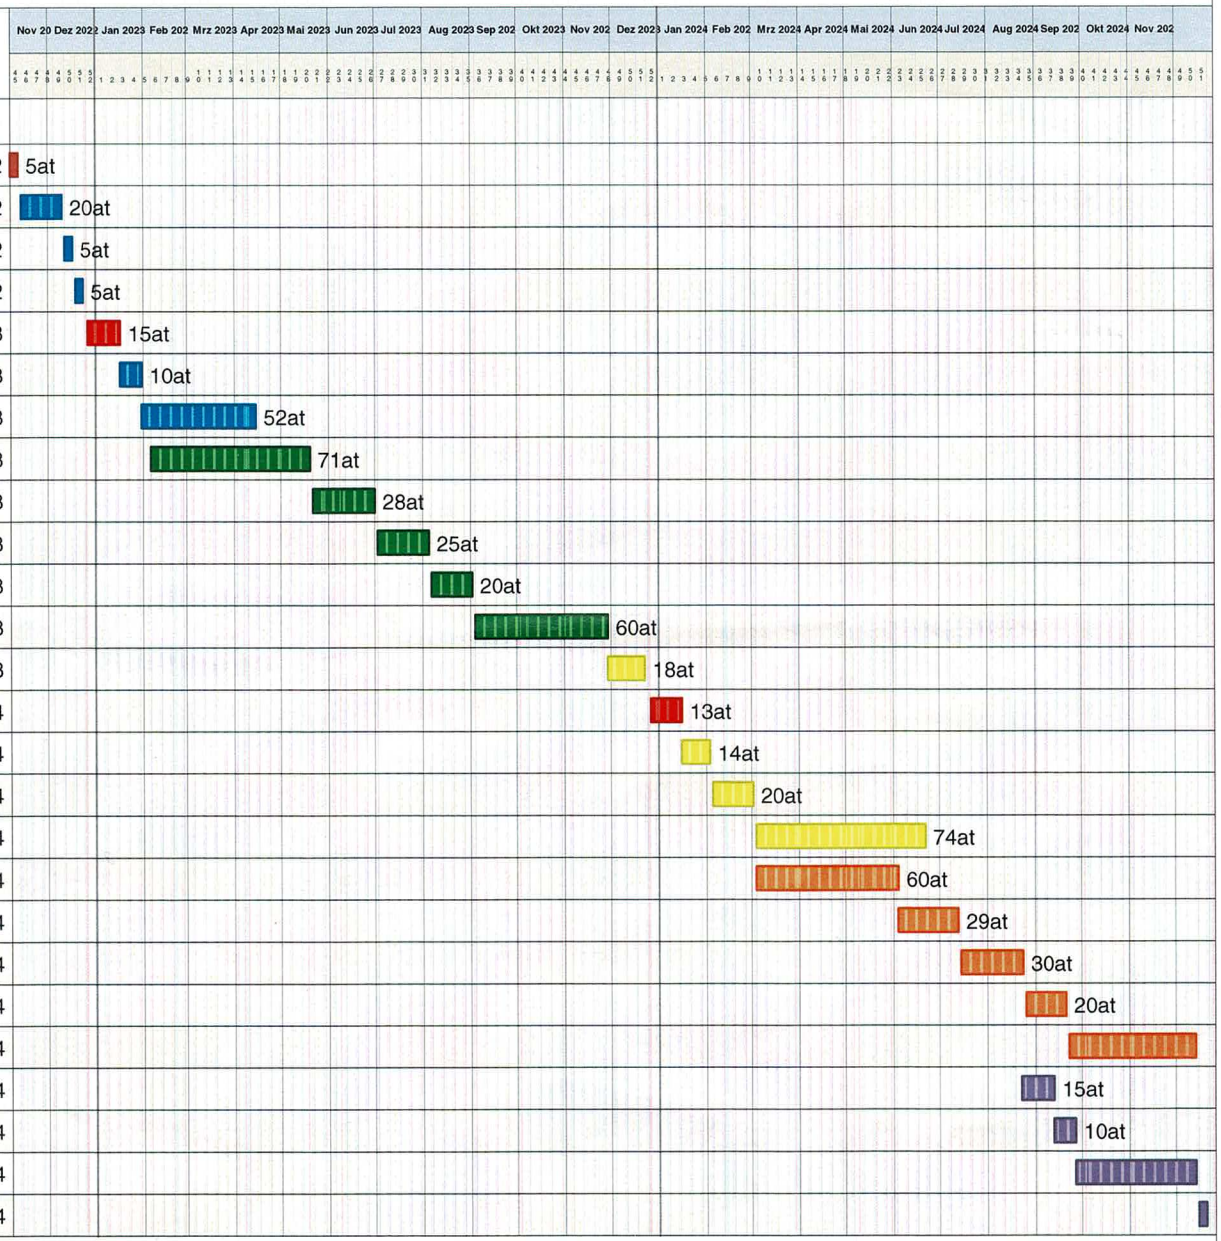

Projektzeitrahmen von 07.11.2022 bis 31.12.2024

Druckdatum: 06.12.2022 07:23

HEBAU GmbH
Carl-Zeiss-Str.11
55129 Mainz
Tel. 06131 -693000
Fax 06131-6930022
e-Mail: kraehnke@hebau-mainz.de

erstellt mit pro-Plan 5 (5.0.1.68) Serien Nr.: 1393 Lizenz für Hebau GmbH, Mainz
